


TỔNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Dự án: NHÀ Mr Ngọc - Q2
Gói thầu: Design and Build (D&B)

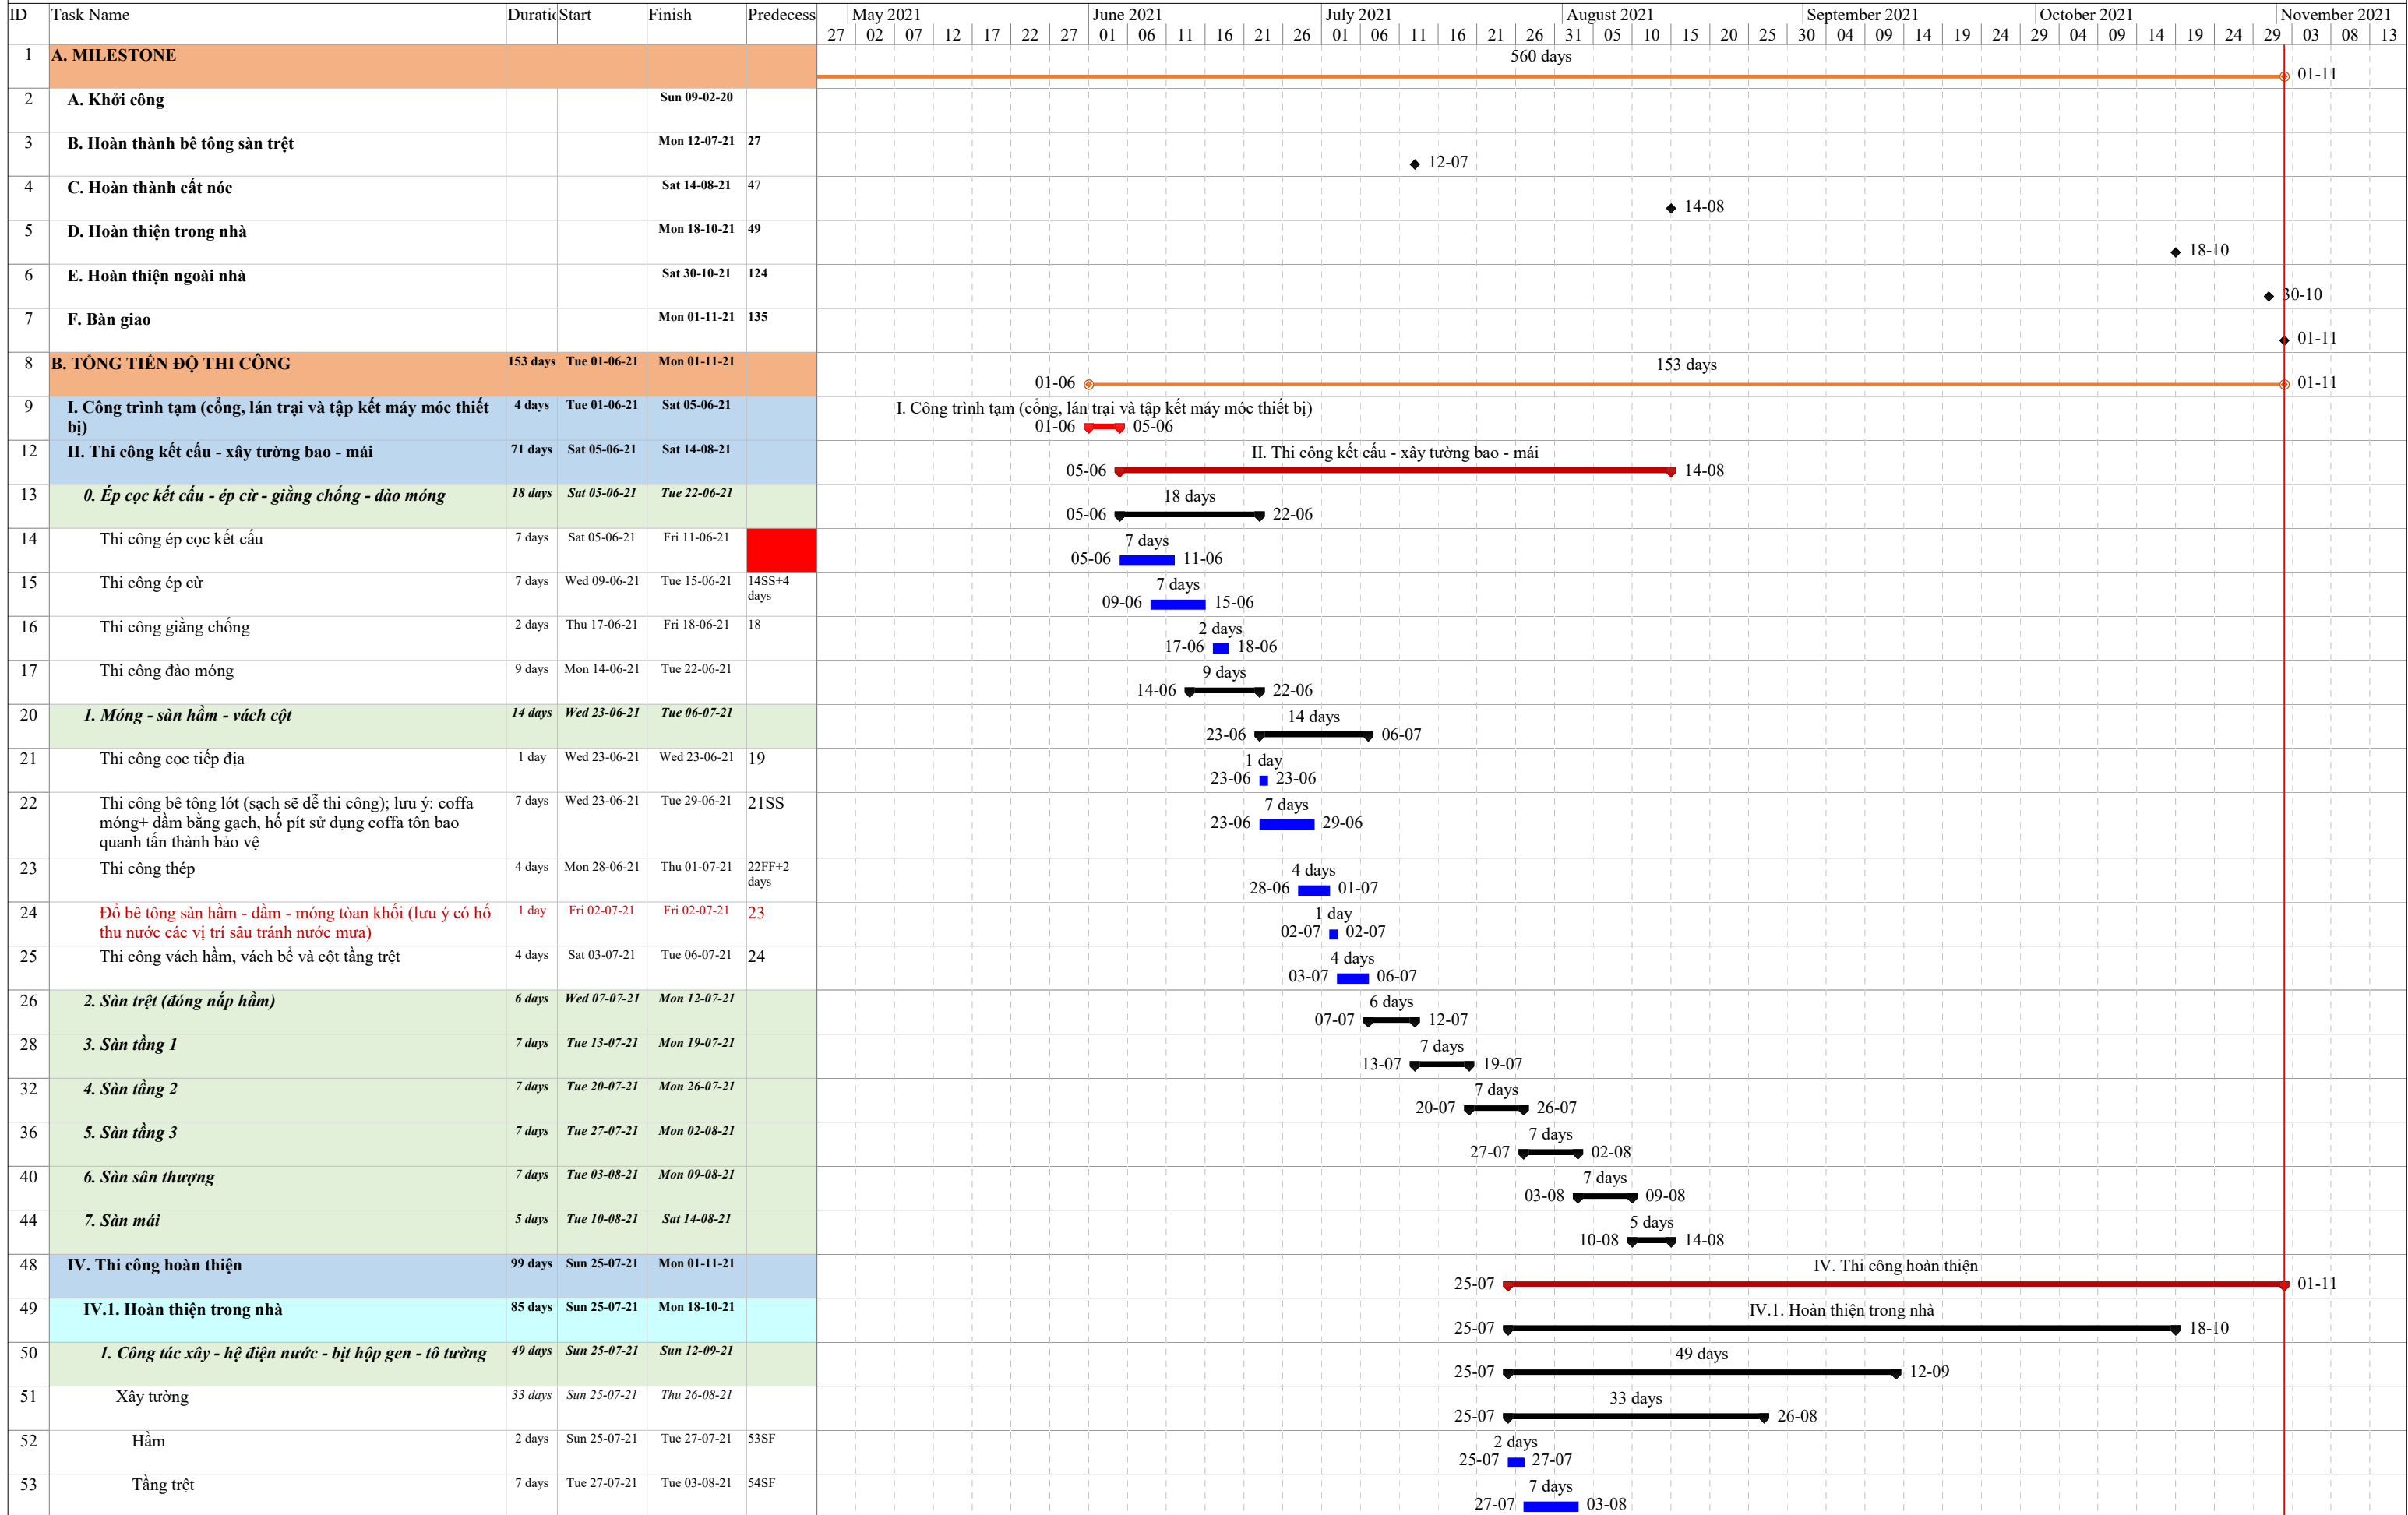

TỔNG TIÊN ĐỘ THI CÔNG

Dự án: NHÀ Mr Ngọc - Q2
Gói thầu: Design and Build (D&B)



ID	Task Name	Duratic	Start	Finish	Predecess	May 2021							June 2021						July 2021					August 2021					September 2021					October 2021				November 2021		
						27	02	07	12	17	22	27	01	06	11	16	21	26	01	06	11	16	21	26	31	05	10	15	20	25	30	04	09	14	19	24	29	04	09	14
54	Tầng 1	7 days	Tue 03-08-21	Tue 10-08-21	35FS+7 days,55SF																	03-08	7 days	10-08																
55	Tầng 2	7 days	Tue 10-08-21	Tue 17-08-21	39FS+7 days,56SF																	10-08	7 days	17-08																
56	Tầng 3	7 days	Tue 17-08-21	Mon 23-08-21	43FS+7 days,57SF																	17-08	7 days	23-08																
57	Sân thượng	5 days	Sun 22-08-21	Thu 26-08-21	47FS+7 days																	22-08	5 days	26-08																
58	Đi ô cắm - công tắc - hệ cấp thoát nước toilet	19 days	Sun 15-08-21	Fri 03-09-21																		15-08	19 days	03-09																
59	Ô cắm-công tắc-cấp nước toilet; ban công	14 days	Fri 20-08-21	Fri 03-09-21																		20-08	14 days	03-09																
62	Đi hệ thống ống trục hộp gen (cấp thoát nước - cấp điện toàn nhà - điện lạnh - camera)	19 days	Sun 15-08-21	Fri 03-09-21																		15-08	19 days	03-09																
65	Test nước và xây bịt hộp gen	18 days	Wed 18-08-21	Sun 05-09-21																		18-08	18 days	05-09																
68	Tô tường	29 days	Sat 14-08-21	Sun 12-09-21																		14-08	29 days	12-09																
71	2. Công tác hoàn thiện toilet (đóng trần - chống thấm - ốp gạch)	29 days	Thu 19-08-21	Fri 17-09-21																		19-08	29 days	17-09																
72	Hầm	2 days	Thu 19-08-21	Sat 21-08-21	73SF																	19-08	2 days	21-08																
73	Tầng trệt	6 days	Sat 21-08-21	Fri 27-08-21	74SF																	21-08	6 days	27-08																
74	Tầng 1	6 days	Fri 27-08-21	Fri 03-09-21	75SF																	27-08	6 days	03-09																
75	Tầng 2	6 days	Fri 03-09-21	Thu 09-09-21	76SF																	03-09	6 days	09-09																
76	Tầng 3	6 days	Thu 09-09-21	Wed 15-09-21	77SF																	09-09	6 days	15-09																
77	Sân thượng	3 days	Wed 15-09-21	Fri 17-09-21	68FF+5 days																	15-09	3 days	17-09																
78	3. Công tác đóng trần	23 days	Wed 25-08-21	Fri 17-09-21																		25-08	23 days	17-09																
79	Tầng trệt	5 days	Wed 25-08-21	Mon 30-08-21	80SF																	25-08	5 days	30-08																
80	Tầng 1	5 days	Mon 30-08-21	Sun 05-09-21	81SF																	30-08	5 days	05-09																
81	Tầng 2	5 days	Sun 05-09-21	Fri 10-09-21	82SF																	05-09	5 days	10-09																
82	Tầng 3	5 days	Fri 10-09-21	Wed 15-09-21	83SF																	10-09	5 days	15-09																
83	Sân thượng	3 days	Wed 15-09-21	Fri 17-09-21	77FF																	15-09	3 days	17-09																
84	4. Công tác thi công thang máy	44 days	Fri 27-08-21	Sun 10-10-21																		27-08	44 days	10-10																
85	Thi công toàn bộ hệ ray	10 days	Fri 27-08-21	Mon 06-09-21	51																	27-08	10 days	06-09																
86	Thi công lắp đặt - hoạt động thử nghiệm	2 days	Thu 07-10-21	Fri 08-10-21	100FF																		2 days	08-10																
87	Bản giao thang máy	2 days	Sat 09-10-21	Sun 10-10-21	86																	09-10	2 days	10-10																
88	5. Công tác cán nền - xử lý nền chống thấm	14 days	Mon 13-09-21	Sun 26-09-21																		13-09	14 days	26-09																
89	Tầng mái	2 days	Mon 13-09-21	Tue 14-09-21	68																	13-09	2 days	14-09																
90	Sân thượng	2 days	Wed 15-09-21	Thu 16-09-21	89																	15-09	2 days	16-09																
91	Tầng 3	2 days	Fri 17-09-21	Sat 18-09-21	90																	17-09	2 days	18-09																
92	Tầng 2	2 days	Sun 19-09-21	Mon 20-09-21	91																	19-09	2 days	20-09																
93	Tầng 1	2 days	Tue 21-09-21	Wed 22-09-21	92																	21-09	2 days	22-09																
94	Tầng lửng	2 days	Thu 23-09-21	Fri 24-09-21	93																	23-09	2 days	24-09																
95	Tầng trệt	2 days	Sat 25-09-21	Sun 26-09-21	94																	25-09	2 days	26-09																

